簡易組み立て断熱型仮設住宅

今回の東日本大震災に向けて、必要なライフラインが未整備な地域でも
仮設住宅としての機能を確保できるように設計した住宅を提案しています。
特に、建築資材が生産できず、極端に不足している状況を鑑みて８０％の部材
は木材を中心として、調達可能地域わけを部材ごとにリスト表示しています。

（特徴）A モデル LG-3473【24.8 ㎡】B モデル LG-SH-3487【29.58 ㎡】

○　ログ壁方式の為、被災地域の自力の建築が可能な組み立て構造
○　建築基準法 85 条第 1 項の規定により 30 ㎡以下に設計
○　従来の仮設住宅と異なり、仮設供与終了後、確認申請の対象となる
　　建築物として 80%以上の資材は再使用可能となります。
○　現地での給排水のインフラが未整備の条件を想定の設備設計をしています。
○　専門職（大工、土木）の必要がなく、被災者の雇用機会を創出できる。
○　給排水の復旧が長期化することを見越して、カセット式簡易水洗、
　　加圧式貯水タンク(490Ｌ灯油タンクを改造)、電気温水器（13L 貯湯）
　　シャワーユニットを付属設備としました。
○　独立家屋により、音の問題を最小限に抑え、断熱(等級３)、気密化を考慮し、
　　従来の仮設住宅の問題点を出来るだけ解決しました。

（過去の仮設住宅の問題点）

■　隣や外の音が煩い。（連棟化、気密が不足、断熱不足）
■　収納が少ない　　（間仕切り工事を省略する構造の為、収納が少ない）
■　寒暖の対策がない（屋根の断熱不足⇒夏が暑い、床の断熱不足⇒冬寒い）
■　雨漏り、水漏れ　（屋根の構造が簡易、防水工事が不十分、冬の巣が漏り）
■　湿度が高い　（冬の壁の結露、夏の換気不足、通風が悪い）

（ＬＧ－ＳＨモデルの対応）

□　木製窓に複層ガラスを使用して、断熱、音対策に配慮。
□　収納スペースを出来るだけ大きく確保。
□　断熱レベルをⅢ地域の等級３として、一般住宅並みの断熱仕様としました。
□　雨漏り、水漏れは屋根の構造上の欠陥が大きな原因で仮設住宅屋根の
　　簡単な構造にその原因があります。屋根の断熱が不足の場合は、夏の
　　暑さ、冬の巣が漏りを防ぐことが出来ません。この対策として、屋根断熱
　　と気密化されたログ壁構造と外断熱工対応しました。
□　室内湿度が高い理由として、気密化されていない仮設住宅の場合、冬季は
　　外気の相対湿度が低いにもかかわらず、壁、押入れ等の壁の表面温度が
　　断熱欠損により、カビ、結露等が発生します。このため湿度が高く感じ
　　られます。　夏の高温多湿は気密化により室内の風通しがよく、扇風機
　　でも涼しさを得ることが可能です。

※ドーム型仮設住宅の平面図と意匠図は【カタログ・図面】クリック願います。

ドーム屋根型倉庫・車庫・店舗・住居

【上記は今回提案している仮設住宅のイメージ形状で実際とは異なります。】

断熱型ダブルログ施工写真集

※詳細についてはトップページのメールまたは電話にてお問い合わせください。

サンパックス㈱　　仮設住宅担当：泉澤直輝

仮設住宅詳細の目次

（１）　平面図　展開意匠図

モデル　LG-SH3473　（24８㎡）

モデル　LG-SH3487　（29.7 ㎡）

（２）　給排水配管図（台所、洗濯機、シャワー室）

（３）　組み立てのチャート図（模範工程表）

（４）　部材構成と現地調達可能材料リスト表

（５）　断熱構成と東北３県断熱基準（Ⅲ地域）

費用積算表　【２モデル】

LG-SH3473,LG-SH3487 共通　配管系統図

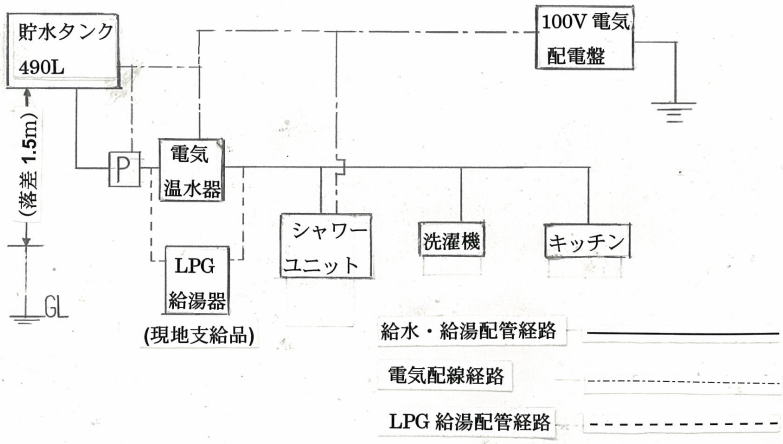



シャワーユニットブース	
寸法	900mmx900mmx2080mm
付属品	ハンドシャワーセット 照明器具、シャンプー棚
給排水	給水配管ブース、排水パン

電気温水器(重量 20K)
消費電力：450W 貯湯タンク：14L 湧き上がり：60℃ 湧き上時間：91 分 減圧弁付き(0.68) 先止め式(蛇口)



加圧ポンプ(給水側)
荏原製作所製 消費電力：50W 品番：単相 100V （20HPHF005S）

貯水タンク
貯水量：490L 最大高：2400mm 基礎：束石ｘ4 個 W:1300xD:1500mm

ドーム型仮設住宅組み立て工程チャート

↓

○災害計画	（1）各市長村役場　災害住宅整備課
○自費復興	（2）個人・設計事務所・工務店・レンタル会社

↑↓

サンパックス㈱
見積依頼受領
見積、図面送付

↑↓　（場所の選定⇒届け出⇒設置⇒解体⇒移設時は確認申請）

注文確定	基礎施工図、ログ、躯体組み立図、部材図送付

↑　↓

地方自治体(市長村)	現場責任者との打ち合わせ
建築関係者	組み立て指導（希望による）
個人の自費復興者	コンテナー手配（部材送付）

↓

作業工程	作業内容	専門職	素人職	作業日数
仮設・基礎	コンテナー荷下ろし、束石基礎	1名	3名	1日目
床組、壁組	床ネタ組・壁ログ組・ドーム屋根組	1名	3名	2日目
屋根断熱、屋根	屋根下地組・断熱工事・屋根材張り付	1名	3名	3日目
建具・間仕切	建具組み込み・間仕切・台所・棚付け	1名	3名	4日目
電気工事（同日）	電気工費（配線・器具取り付け）	1名		4日目
給排水工事	給水，給湯配管、シャワーユニット	2名		4日目
断熱工事	壁断熱、床断熱、壁材張り、床貼り	1名	3名	5日目
塗装、防水工事	外部塗装、防止コーキング、ダメ工事	1名	3名	6日目

（注１）　専門職とは大工及び組み立て指導員　素人職とは被災雇用者

ドーム型仮設住宅供給部材内訳○―供給部材　△―現地調達可能材　×―現地支給					
○	ログ壁材(@32mmx125mm)	○	窓・網戸・内外建具	△	金物関係一式
○	床材（タイルカーペット）	○	屋根材	△	配管材料(給排水)
○	天井材(@32mmx55mm)R 用	○	断熱材/付属材	△	下地材、OSB
○	幅木、台輪、額縁	○	シャワーユニット	△	外壁材(木張り)
○	玄関ドアー(800mmx1800mm)	○	貯水タンク 490L	△	工具類・作業脚
○	束石（L:450mm）基礎材料	○	加圧ポンプユニット	△	作業製作ビデオ
○	外壁塗料/刷毛/コーキング	○	電気温水器（LPG の場合は不要）		

（注２）現地調達可能材とは、北海道での生産品以外の物で新潟、秋田両県で入手可能品。

ドーム型仮設住宅の断熱構成			
断熱部位 （生産地域は北海道）	熱伝導率	断熱厚	熱抵抗値
屋根断熱 GW24K(@50mm)	0.038	50ｍｍ	1.615
ログ材@32mm+外壁 15ｍｍ			等級３　1.5
壁断熱　GW24K(@50mm)	0.038	50mm	1.615
ログ材@32mm+外壁 15mm			等級３　1.1
床断熱　HGW16K	0.036	100mm	2.77
仕上げはタイルカーペット			等級３　2.2
開口部の断熱(木製サッシ)	熱貫流率	木部熱伝導率	樹脂熱伝導率
複層ガラス(3-12-3)	2.4	0.15	0.21
断熱地域：宮城県、福島県、岩手県はⅢ地域			

(防火関係の認定)

（１）外壁材を木壁として使用する場合の規定

構造認定の面材を壁の下地として使用する。

使用面材：　かべ震火　@9.5mmx910mmx2100mm

構造認定番号：PC030BE-0670　外装材の制限なし

(長期許容地耐力の算定)

（１）束石基礎を使用する場合(品確法の地耐力 50ｋN/㎡を使用)

地盤の算定：　仮定―地下２M 迄を地盤表面の積載加重到達と仮定した場合、㎡当たりのその仮地盤の長期許容加重は 1mx1mx2mx2.4(土砂の比重)＝4.8ｔ(47ｋN)。

単純判定：地盤の水位が経験的に２M 以下である。

近隣地盤が粘土、砂質である。(軟弱地盤ではない)

歩行しても，靴跡が沈まない。(水位が低い)

LG-SH3487 の全体重量：躯体重量　≒300Kg./㎡（全体は９ｔ）

床加重　　180Kg/㎡

積雪加重　　50Kg./㎡

合計　≒530Kg./㎡ x29.7 ㎡＝15.74ｔ＝154ｋN

束石の底面積：　400mmx400mmx50ｋN=8kN/個

束石の必要数量：154ｋN÷7.52≒20 個以上必要

ドーム型仮設住宅材料費見積参考例　　ＬＧ－ＳＨ３４３２

No. 1238（1/3）

御 見 積 書

2011年03月31日

サンパックス株式会社

〒050-0064
室蘭市舶木町11丁目5号
TEL:0143-55-4321 FAX:0143-55-4325
(工場) 室蘭市崎守町387番地23号
TEL. 0143-59-4321　FAX 0143-59-4326
北海道銀行　　東室蘭支店　(普通) ０６１７３３７
伊達信金　　室蘭支店　(普通) ００５３２６３
【E-mail】info@sunpax.jp

北海道仮設住宅事業所　　殿

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額　　¥611,803−

上記金額には消費税 29,133円が含まれております。

担当者		

件　　名：シェルターハウス製作材料リスト(LGSH3432)

受渡期日：受注後30日　　取引方法：従来通り　　担当者

受渡場所：当社工場　　有効期限：　　景陣

見積範囲

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
1	シェルターハウス LGSH-3432				
2	【寸法】 3400mmx3200mm				
3	【材料費】				
4	1)壁材/桁材/ノッチ材 2x6x12	102枚	800	81,600	
5	2)ドーム天井材 2x6x12	38枚	800	30,400	
6	3)妻壁 2x6x12(3通り)	15枚	800	12,000	
7	4)床ネタ 2x6x12	15枚	800	12,000	
8	OSB@9mmx910mmx1820mm	8枚	750	6,000	
9	5)タイルカーペット(500mmx500mm)	49枚	350	17,150	
10	(建具)				
11	1)トイレドアー(600mmx1800mm)	1式		28,000	
12	2)窓　(500mmx500mm)+網戸	2台	25,000	50,000	
13	(副材費)				
14	1)建具開係(飾り底、額縁)				
15	＜次 頁 へ 続く＞				
	頁　小　計			237,150	

No. 1238（2/3）　シェルターハウス製作材料リスト(LGSH3432)

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
16	＜前 頁 から 繰 越＞			237,150	
17	飾り底	2セット	2,500	5,000	
18	外枠	13m	450	5,850	
19	内枠	13m	450	5,850	
20	2)額縁板金	10m	500	5,000	
21	(屋根材関係)				
22	1)アスファルトルーフィング	15m3	300	4,500	
23	2)シングルルーフ【防火認定材】	15㎡	2,600	39,000	
24	3)水切り(18mmx45mm)	7.2m	350	2,520	
25	4)野地材(R用)@12mmx55mm	15㎡	1,800	27,000	
26	(副材費)	1式		15,000	
27	(ログ製作加工費)	1式		50,000	
28	(ログ加工小計 ￥391，570(税別)				
29					
30	【断熱工事】				
31	1)屋根断熱(GW@50mm)	15㎡	400	6,000	
32	2)壁断熱 (GW@50mm)	22㎡	400	8,800	
33	3)床断熱 (GW@100mm)	11㎡	750	8,250	
34	4)ポリフィルム(@0.1mm)	30㎡	200	6,000	
35	5)タイベック	30㎡	450	13,500	
36	6)屋根下地材【@38mmx50mmx4200mmx@455mm】	9本	750	6,750	
37	7)R破風用袋物板金	8.6m	1,000	8,600	
38	【防火構造下地】				
39	1)ダイライトMS@9mmx910mmx3030mm	9枚	4,100	36,900	
40	(注1) 施工寸法にカット				
41	＜次 頁 へ 続く＞				
	頁　小　計			491,670	

No. 1238（3/3）　シェルターハウス製作材料リスト(LGSH3432)

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
42	＜前 頁 から 繰 越＞			491,670	
43	(注2)解体⇒移設時はMS12mm使用の事。				【構造認定用】
44	2)壁下地 (@38mmx50mmx2000mm)	27本	300	8,100	
45	アルミ水切り(L:4000mm)	3本	1,500	4,500	
46	3)木外壁(@15mmx90mmx3640mm)	21㎡	2,100	44,100	
47	胴縁下地【@18mmx45mmx3640mm)	15本	160	2,400	
48	4)破風板金水切り	7m	600	4,200	
49	【諸経費】				
50	1)諸経費/梱包/積み込み費用(5%)	1式		27,700	
51	＜以 下 余 白＞				
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
	合　計			582,670	消費税(5%)　29,133

ドーム型仮設住宅材料費見積参考例　　ＬＧ－ＳＨ３４３９

No. 1242（1/6）

御 見 積 書

2011年03月31日

サンパックス株式会社
〒050-0064
室蘭市柏木町11丁目5号
TEL:0143-55-4321 FAX:0143-55-4325
[工場] 室蘭市崎守町387番地23号
TEL 0143-59-4321 FAX. 0143-59-4326
北海道銀行　東室蘭支店　(普通) 0 6 1 7 3 3 7
伊達信金　室蘭支店　(普通) 0 0 5 3 2 6 3
【E-mail】info@sunpax.jp

北海道仮設住宅事業　　御中

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額　¥747,962−

上記金額には消費税 35,617円が含まれております。

担当者		

件　名：LG－SH3439　居住棟材料費

受渡期日：受注後30日～40日　　取引方法：従来通り　　担当者：景澤

受渡場所：当社工場　　有効期限：60日

見積範囲

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
1	シェルター型ログハウス(LG−SH3439)				
2	(寸法) W:3400mm xD:3900mm				
3	(工法) ログシェルタージョイント方式				
4	□居住棟(3400mmx3900mm)				
5	1)ログ壁 /桁材/ノッチ材/ドーム 2x6x14	76枚	900	68,400	
6	2x6x12	51枚	800	40,800	
7	2)ネタ材 2x6x14	15枚	900	13,500	
8	床材 OSB(9.5mmx910mmx1820mm)	8枚	750	6,000	
9	ネタ金物	55個	90	4,950	
10	3)建具				
11	玄関ドアー(800mmx1800mm)複層ガラス	1台		45,000	
12	木製窓 (600mmx980mm)	4台	16,000	64,000	
13	網戸 (650mmx1050mm)	2本	12,500	25,000	
14	枠/飾り巾(RC納まり枠仕様)	1式		25,000	(外断熱)
15	＜次 頁 へ 続 く＞				
	頁 小 計			292,650	

No. 1242（2/6）　LG－SH3439 居住棟材料費

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
16	＜前 頁 か ら 繰 越＞			292,650	
17	4)床材				
18	タイルカーペット(500mmx500mm)	56枚	350	19,600	
19	幅木 (12mmx65mmx3600mm)	3本	650	1,950	
20	5)押入れ材				
21	受け材(ログ材)	2本	1,600	3,200	
22	OSB 910mmx1820mm	2枚	800	1,600	
23	枠材 【@35mmx55mmx2000mm】	3本	1,050	3,150	
24					
25	□ 屋根材				
26	1)アスファルトルーフィング	18㎡	300	5,400	
27	2)シングルルーフ【不燃認定材】	18㎡	2,600	46,800	
28	3)板金役物			2,350	
29	R型破風	8.5m	1,000	8,500	
30	軒天見切り板金	8.5m	600	5,100	
31	□ ログ加工費	1式		50,000	
32	ネタ加工/R壁加工	1人工		15,000	
33					
34	居住棟小計: ￥465,300(税別)				
35					
36	(断熱部材費)				
37	1)基礎断熱(GW@50m)	18㎡	400	7,200	
38	2)壁断熱 (GW@50mm)	25㎡	400	10,000	
39	3)床断熱 (GW@100mm)	13.5㎡	750	10,125	
40	4)ポリフイルム(@0.1mm)	57㎡	200	11,400	
41	＜次 頁 へ 続 く＞				
	頁 小 計			494,025	

No. 1242（3/6）　LG－SH3439 居住棟材料費

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
42	＜前 頁 か ら 繰 越＞			494,025	
43	5)タイベック	57㎡	450	25,650	
44	6)屋根下地(@38mmx50mmx4280mm)	11本	950	10,450	
45	7)野地材(@12mmx55mmx4280mm)	18㎡	1,800	32,400	
46	8)板金R破風役物	8.6m	1,000	8,600	
47	【防火構造下地】				
48	1)ダイライトMS@9mmx910mmx3030mm	10枚	4,100	41,000	
49	【注1】施工寸法にてカット				
50	【注2】解体⇒移設時は防火構造認定MS@12mm				
51	を使用すること。				
52	2)壁下地(@38mmx50mmx2100mm)	29本	300	8,700	
53	胴縁下地(@18mmx45mmx3640mm)	17本	160	2,720	
54	アルミ水切り【L:4000mm)	3本	1,500	4,500	
55	3)木壁材(@15mmx90mmx3640mm)	24㎡	2,100	50,400	
56					
57	【諸経費】				
58	1)諸経費/梱包/積み込み費用(5%)	1式		33,900	
59					
60	(以下余白)				
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67	＜次 頁 へ 続 く＞				
	頁 小 計			712,345	

ドーム型仮設住宅材料費見積参考例　　ＬＧ－ＳＨ３４５５

No. 1243（1/3）

御 見 積 書

2011年03月31日

サンパックス株式会社
〒050-0064
室蘭市柏木町11丁目5号
TEL. 0143-55-4321 FAX. 0143-55-4325
（工場）室蘭市崎守町387番地23号
TEL. 0143-59-4321 FAX. 0143-59-4326
北海道銀行　　東室蘭支店　（普通）０６１７３３７
伊達信金　　室蘭支店　（普通）００５３２６３
【E-mail】 info@sunpax.jp

北海道仮設住宅事業　　御中

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額　　¥937,671−

上記金額には消費税 44,651円が含まれております。

担当者		

件　　名：LG－SH345大型居住棟材料費
受渡期日：受注後30日ー60日　　取引方法：従来通り　　担当者
受渡場所：当社工場　　有効期限：60日　　泉澤

見積範囲
キット価格

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
1	ドーム型仮設住宅 LG－SH3455モデル				
2	（寸法） 3400mmx5500mm				
3	（工法） ログ組方式連結用				
4	□ 居住棟(W:3400mm xD:5500mm)				
5	1)ログ壁/桁/ノッチ/ドーム天井 2x6x20	76枚	1,480	112,480	
6	2x6x12	66枚	800	52,800	
7	2)ネタ材 2x6x20	4枚	1,480	5,920	
8	2x6x12	22枚	800	17,600	
9	OSB @9mm x910mm x1820mm	13枚	750	9,750	
10	タイルカーペット(500mmx500mm)	77枚	350	26,950	
11	3)クローゼット(2ヶ所)				
12	棚受け材【ログ材】@32mmx125mmx6100mm	2枚	2,100	4,200	
13	OSB @9mmx450mmx3030mm	4枚	850	3,400	
14	枠材 @35mmx55mmx2100mm	6本	1,500	9,000	
15	＜次 頁 へ 続 く＞				
	頁　小　計			242,100	

No. 1243（2/3）　　LG－SH345大型居住棟材料費

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
16	＜前 頁 から 繰 越＞			242,100	
17	間仕切枠材(2ヶ所)@35mmx55mmx2100mm	6本	1,500	9,000	
18	4)金物 ネタ金物2x6用(2x4)	72個	90	6,480	
19	ビズ L:32mm,51mm,75mm,90mm	1式		8,000	
20	5)建具				
21	玄関ドアー【800mmx1800mm】	1台		45,000	（複層ガラス）
22	木製窓 【600mmx980mm】	4台	16,000	64,000	（複層ガラス）
23	網戸 （プリーツタイプ)木枠付き）	2本	12,500	25,000	
24	化粧枠、飾り底(RC納まり仕様)	1式		25,000	
25	6)副材費				
26	幅木（@12mmx60mmx3640mm）	6本	650	3,900	
27	□ 屋根材料				
28	1)アスファルトシングルルーフ(22K)	26㎡	300	7,800	
29	2)シングル材【不燃認定品】	26㎡	2,600	67,600	
30	3)板金役物				
31	R破風	8.5m	1,000	8,500	
32	軒天水切り板金	12m	600	7,200	
33	□ ログ加工費	1式		50,000	
34	ネタ加工/R壁加工	1人工		15,000	
35	（居住棟材料合計￥584，580/税別）				
36	□ 断熱部材費				
37	1)屋根断熱 （GW@50mm）	26㎡	400	10,400	
38	2)壁断熱 （GW@50mm）	30㎡	400	12,000	
39	3)床断熱 （GW@100mm）	19㎡	750	14,250	
40	4)ポリフイルム(@0.1mm）	75㎡	200	15,000	
41	＜次 頁 へ 続 く＞				
	頁　小　計			636,230	

No. 1243（3/3）　　LG－SH345大型居住棟材料費

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
42	＜前 頁 から 繰 越＞			636,230	
43	5)タイベック	75㎡	450	33,750	
44	6)屋根下地(@38mmx50mmx6100mm)	11本	1,100	12,100	
45	7)野地板(R屋根用)@12mmx55mmx3640mm	26㎡	1,800	46,800	
46	□ 防火構造下地				
47	1)ダイライトMS @9mmx910mmx3030mm	13枚	4,100	53,300	
48	（注1）施工寸法にてカット済みとする。				
49	（注2）解体⇒移設時はMS12mm使用の事				（構造認定）
50	2)壁下地 @38mmx50mmx2100mm	35本	300	10,500	
51	@18mmx45mmx3640mm	24本	160	3,840	
52	3)木壁材(@15mmx90mmx3640mm)	30㎡	1,800	54,000	
53	□ 諸経費				
54	1)諸経費/梱包/積み込み費用(5%)	1式		42,500	
55	＜以 下 余 白＞				
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
	合　計			893,020	消費税(5%) 44,651

ドーム型仮設住宅衛生設備等部材費見積例　設備棟 LG-SH3432

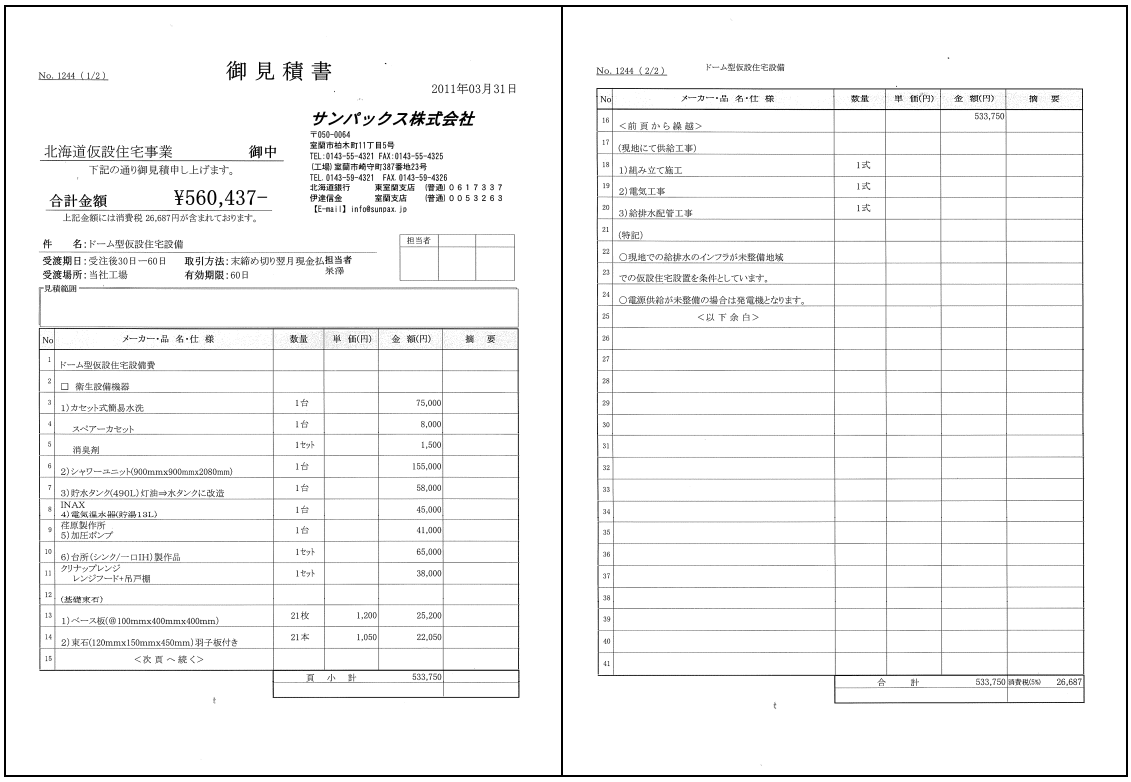

No. 1244（1/2）

御 見 積 書

2011年03月31日

サンパックス株式会社
〒059-0064
室蘭市祝木町11丁目5号
TEL.0143-55-4321 FAX.0143-55-4325
(工場) 室蘭市崎守町387番地23号
TEL.0143-59-4321 FAX.0143-59-4326
北海道銀行　東室蘭支店　(普通) 0617337
伊達信金　室蘭支店　(普通) 0053263
【E-mail】info@sunpax.jp

北海道仮設住宅事業　御中

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額　¥560,437−

上記金額には消費税 26,687円が含まれております。

件　名：ドーム型仮設住宅設備
受渡期日：受注後30日ー60日　取引方法：末締め切り翌月現金払担当者 笨澤
受渡場所：当社工場　有効期限：60日

担当者		

見積範囲

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
1	ドーム型仮設住宅設備費				
2	□ 衛生設備機器				
3	1)カセット式簡易水洗	1台		75,000	
4	スペアーカセット	1台		8,000	
5	消臭剤	1セット		1,500	
6	2)シャワーユニット(900mmx900mmx2080mm)	1台		155,000	
7	3)貯水タンク(490L)灯油⇒水タンクに改造	1台		58,000	
8	INAX 4)電気温水器(貯湯13L)	1台		45,000	
9	荏原製作所 5)加圧ポンプ	1台		41,000	
10	6)台所(シンク/一口IH)製作品	1セット		65,000	
11	クリナップレンジ レンジフード+吊戸棚	1セット		38,000	
12	(基礎束石)				
13	1)ベース板(@100mmx400mmx400mm)	21枚	1,200	25,200	
14	2)束石(120mmx150mmx450mm)羽子板付き	21本	1,050	22,050	
15	<次 頁 へ 続 く>				
	頁　小　計			533,750	

No. 1244（2/2）　ドーム型仮設住宅設備

No	メーカー・品 名・仕 様	数量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
16	<前 頁 か ら 繰 越>			533,750	
17	(現地にて供給工事)				
18	1)組み立て施工	1式			
19	2)電気工事	1式			
20	3)給排水配管工事	1式			
21	(特記)				
22	○現地での給排水のインフラが未整備地域				
23	での仮設住宅設置を条件としています。				
24	○電源供給が未整備の場合は発電機となります。				
25	<以 下 余 白>				
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
	合　計			533,750	消費税(5%) 26,687

LG-SH3473(24.83 ㎡)タイプ　(LG-SH3432+LG-SH3439 連棟モデル)		
モデル型式	本体部材金額(税込)	(摘要)
ＬＧ－ＳＨ－３４３２	￥　６１１，８０３	設備棟
ＬＧ－ＳＨ－３４３９	￥　７４７，９６２	居住棟
LG-SH3432 設備部材費	￥　５６０，４３７	
５ｔコンテナー運賃	￥　６３，０００	(室蘭⇒八戸)
合計	￥１、９８３，２０２　(税込み)	
LG-SH3487(29.58 ㎡)タイプ　(LG-SH3432+LG-SH3455 連棟モデル)		
ＬＧ－ＳＨ－３４３２	￥　６１１，８０３	設備棟
ＬＧ－ＳＨ－３４５５	￥　９３７，６７１	居住棟
LG-SH3432 設備部材費	￥　５６０，４３７	
12ｔコンテナー運賃	￥　１１５，０００	(室蘭⇒八戸)
合計	￥２，２２４，９１１　(税込み)	
